

エイル隊長のパトロール日記

～令和元年度～

のとIC橋 令和元年10月15日

今回のパトロール先は「平成30能越道のと里山空港IC橋上部工事」です。(以下、のとIC橋作業所)

【概況報告】


上部工形式:ポストテンション方式PC単純I形コンポ橋
 橋 長:30.200 m(上り線) 28.970 m(下り線)
 有効幅員:10.000 m(上り線) 10.000 m(下り線)
 工 期:平成31年3月8日 ~ 令和2年2月28日
 発注者:国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所




コンポ橋(合成床版橋)とは?

合成床版橋は、桁と床版が一体となった橋だよ。桁と桁の間にプレキャストのPC床版を置くことで桁本数を減らすことができる。それから場所打ち床版の型枠の役割もある。

桁は分割して運搬して現場で1本の桁にするから支間長が25m~45mの橋に適用されているよ。一般的にコンポ橋と呼ばれてComposite(合成)に由来する。

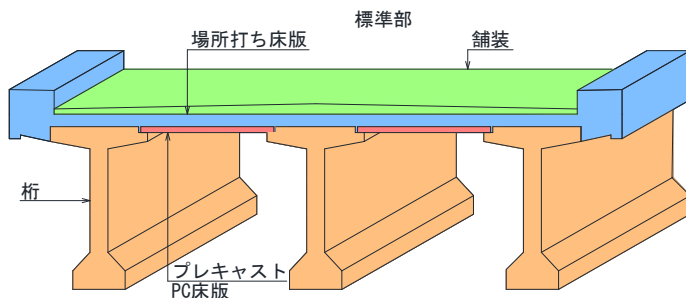

さとるくんの
プチ情報!





よろしくお願いします！



概況説明



目に入るところに注意喚起の看板を設置しているので安全に対する意識を持って作業ができますね！



トイレはフェンスを設置し目隠し対策をしています。さらに男性用と女性用で通路を分けていますね。清掃も行き届いていて、備品もすべて揃っている綺麗なトイレです！



資材置き場はカラーコーンとバリケードで囲いをして、資材が綺麗にまとめられていますね！



階段1段ずつに芝のマットが設置されており、泥を持ち込まない対策がなされています。とてもよい取り組みです。他の現場でも取り入れてもいいですね！



喫煙場所が確保しており、灰皿や消火器もきちんと設置されていました。非喫煙者にも配慮した取り組みですね！



休憩所でタバコのおいがしました。量があるため火災のおそれがありますので、喫煙の際は外に設置してある喫煙場所の利用をおすすめします。



休憩所内に緊急資機材が管理されていてよかったですが、もう少し低い位置にあるとさらによいと思います。



お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました！



パトロール FINISH!
お疲れさまでした





エルル隊長の プチ情報

作業所の近くには、「白米千枚田」や「輪島朝市」などがあります。
棚田はライトアップされるようですので、輪島朝市で海産物のお買い物や、美味しいものをお腹いっぱい食べ、夕方棚田のライトアップで癒される。それに、これからは蟹の美味しい季節です。
一度行かれてみては如何でしょうか？



パトロールの感想



お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました。
パトロール中も私たちの安全面を気にかけていただいたおかげで、パトロールを無事終えることができました。
作業所、休憩所においては資材や書類で煩雑になることなく、綺麗に保たれていたのが日ごろから整理整頓に心がけているのだと感じました。
現場においても職員、作業員ともに正しい服装で安全に作業されていました。
冬になると雪が降る地域だと思いますが、引き続き安全に作業を行っていただきゼロ災害で竣工されますことをパトロール隊一同心より祈っております。

エルぱと隊員 No. 21 C.A
